

DO REQUISITO AO COMPONENTE QUE O ATENDE

TechFix

Assistência Técnica

Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

07/10/2026

Processos de Engenharia
de Software

AP2

Papel e planilhas dificultam acompanhar os atendimentos

RF1

Cadastro

Identificar clientes e equipamentos.

RF2 e RN1

Ordem de serviço

Criar e acompanhar OS, com estado e técnico responsável.

RF3

Pesquisa e histórico

Pesquisar atendimentos e consultar o histórico.

A3: entrevista simulada com Marcos Almeida. A4/A5 consolidam e refinam os requisitos.

Scrum em Sprints de uma semana, com papéis claros

Coerente com o ciclo iterativo e incremental da A2: dois desenvolvedores, entregas pequenas, feedback e revisão frequente.

SCRUM MASTER E DESENVOLVEDOR

Arthur

Interface e integração.
Facilita o fluxo e acompanha
impedimentos.

DESENVOLVEDOR

Lucas

Regras de negócio, persistência
e testes. Participa do
planejamento e da revisão.


PO INDICADO NO PLANEJAMENTO

Chico Mosca

Ordena necessidades e valida
o resultado. Agenda de
feedback a combinar.

Revisão cruzada: ambos precisam compreender todo o sistema.

Uma tarefa só está pronta depois da revisão do colega



Falha identificada → correção · Nova necessidade → backlog

DoD

- Critérios de aceitação atendidos
- Revisão pelo outro integrante
- Testes pertinentes e integração verificada
- Documentação e evidências atualizadas

Registro separado

Validação de negócio pelo PO.

Conexão com A6: revisar antes de declarar concluído.

Dois incrementos entregam valor ao atendimento

I1 · Receber e localizar atendimentos

1 P + 3 M + 1 G

ID	Entrega	Tam.
A8R01	Acesso por perfil	G
A8R02	Cadastro de cliente e equipamento	M
A8R03	Abertura de OS	M
A8R04	Consulta exata pelo número da OS	P
A8R05	Histórico inicial	M

I2 · Acompanhar e concluir serviços

3 M + 1 G

ID	Entrega	Tam.
A8R06	Atribuir técnico, iniciar e listar suas OS	M
A8R07	Concluir OS sem regressão de estado	M
A8R08	Pesquisar por cliente ou equipamento	M
A8R09	Comprovar desempenho	G

A8R01–R08 são Must. A8R09 é Should, mas seu critério deve ser atendido antes da implantação.

O histórico de A8R05 continua no I2. Cada incremento pode ocupar várias Sprints.

P, M e G são tamanhos relativos, com consenso a registrar

Tamanho	Referência	O que entra na estimativa
P	A8R04 · consulta exata	Fluxo limitado, menor incerteza.
M	A8R02 · cadastro	Campos, validações e relacionamentos.
G	A8R01 e A8R09	Autorização e desempenho: incerteza e verificação transversal.

Tamanho inclui implementação e verificação; sem conversão fixa em horas.

Para fechar o consenso da dupla

01	02	03	04
Estimativa individual	Comparação	Discussão das diferenças	Registro do acordo


Acesso indevido e escopo têm as maiores pontuações

Risco	P × I	Nível	Responsável	Mitigação
R1 · Ampliação indevida do escopo	3×3=9	Alto	Arthur	Manter vínculo A5 → backlog; controlar inclusões.
R2 · Acesso indevido	3×3=9	Alto	Arthur	Autorizar no servidor e testar chamadas diretas à API.
R3 · Perda ou inconsistência de histórico	2×3=6	Alto	Lucas	Gravar OS e evento na mesma transação.
R4 · Desempenho sem comprovação	2×2=4	Moderado	Lucas	Medir com até 10.000 OS; registrar ambiente/cenário.

Login local no navegador não comprova proteção no servidor.

P/I: 1 baixa, 2 média, 3 alta. Produto: 1–2 baixo; 3–4 moderado; 6–9 alto. Responsáveis propostos.

O fluxograma mostra sequência, decisões e exceções

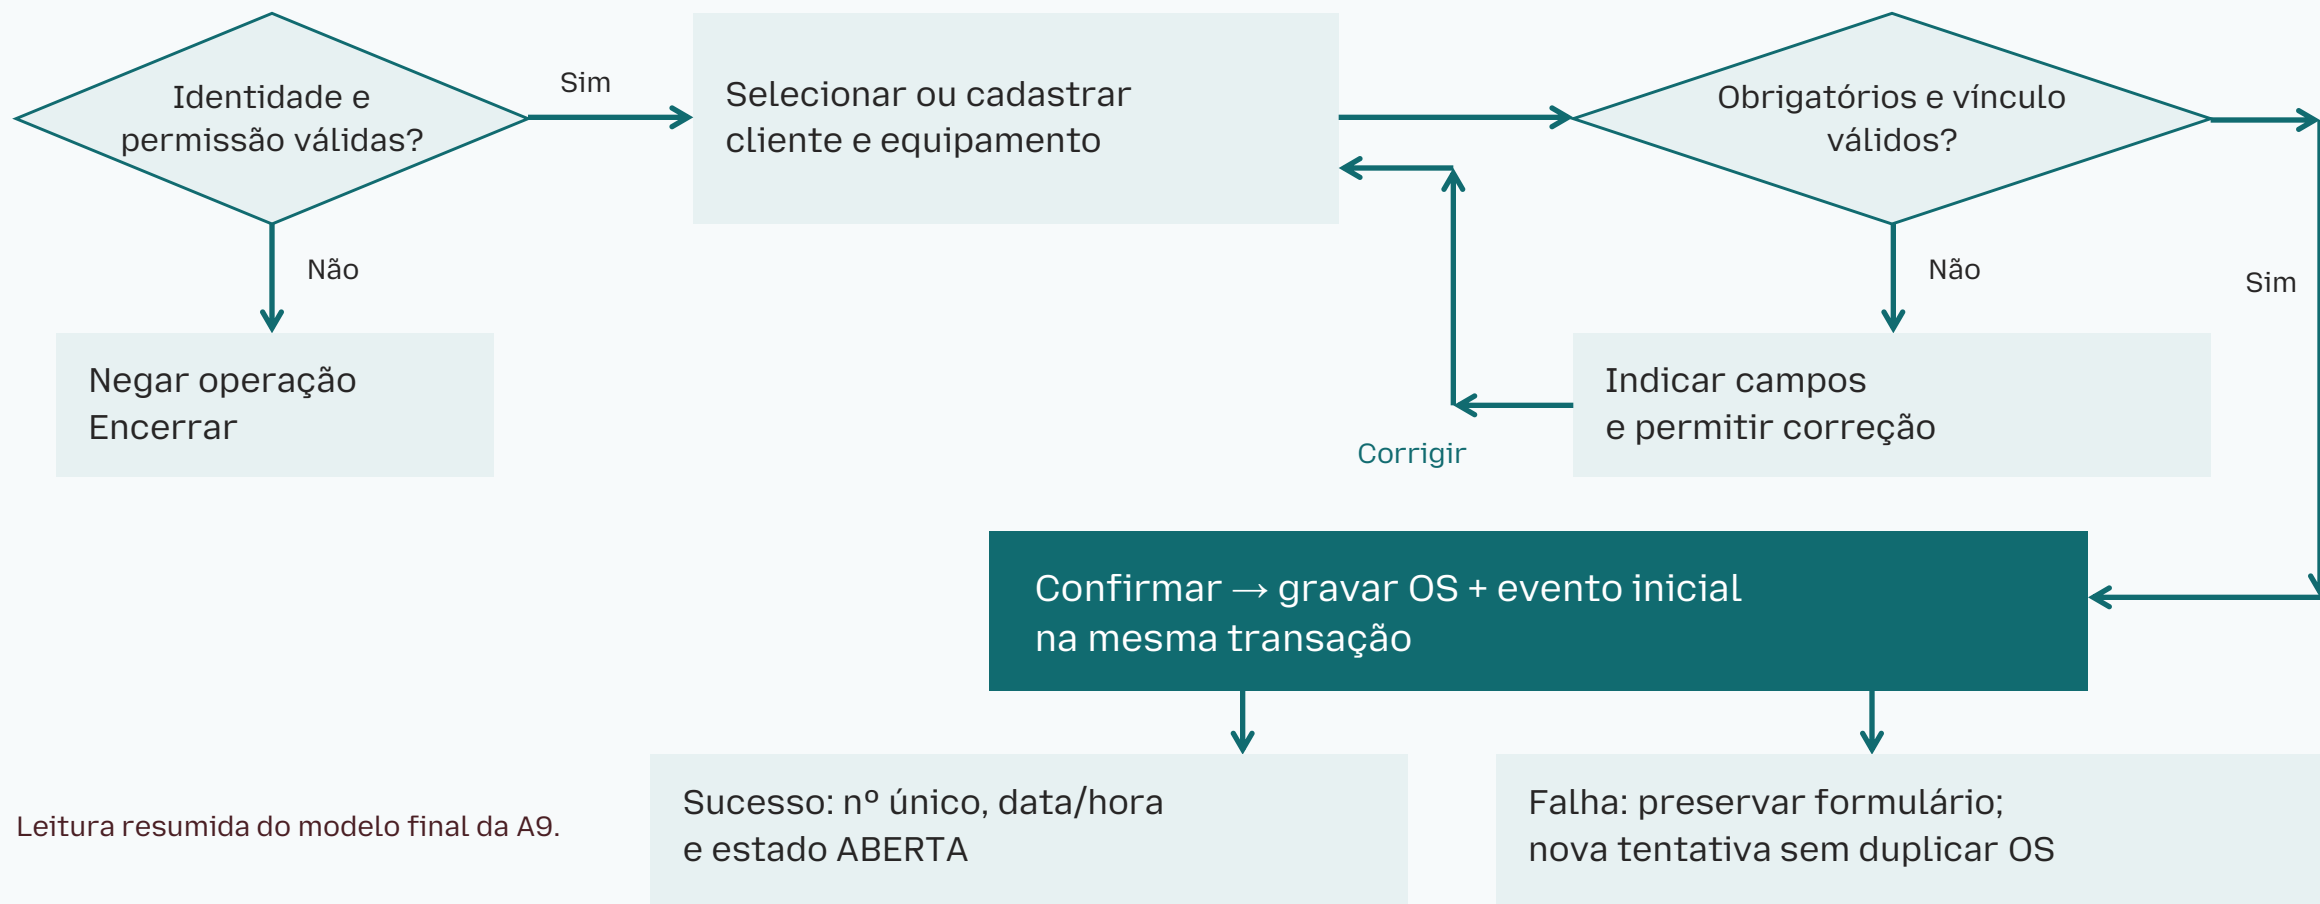

Leitura resumida do modelo final da A9.

O wireframe define campos e mensagens antes de codificar

Nova ordem de serviço

Cliente	Seleção de cliente
Equipamento	Só os vinculados ao cliente

Cadastro rápido

Nome *	Telefone *
Tipo *	Defeito *

* Obrigatórios · Erros junto aos campos

Cancelar

Abrir OS

Campos e estados


- Número, data/hora e estado gerados pelo sistema
- Falha de gravação mantém os dados
- Evitar envios duplicados

Sucesso ou falha

Sucesso apresenta protocolo e ABERTA.

Os estados de sucesso e falha são alternativos.

Quatro componentes, com a interface sem acesso direto ao banco

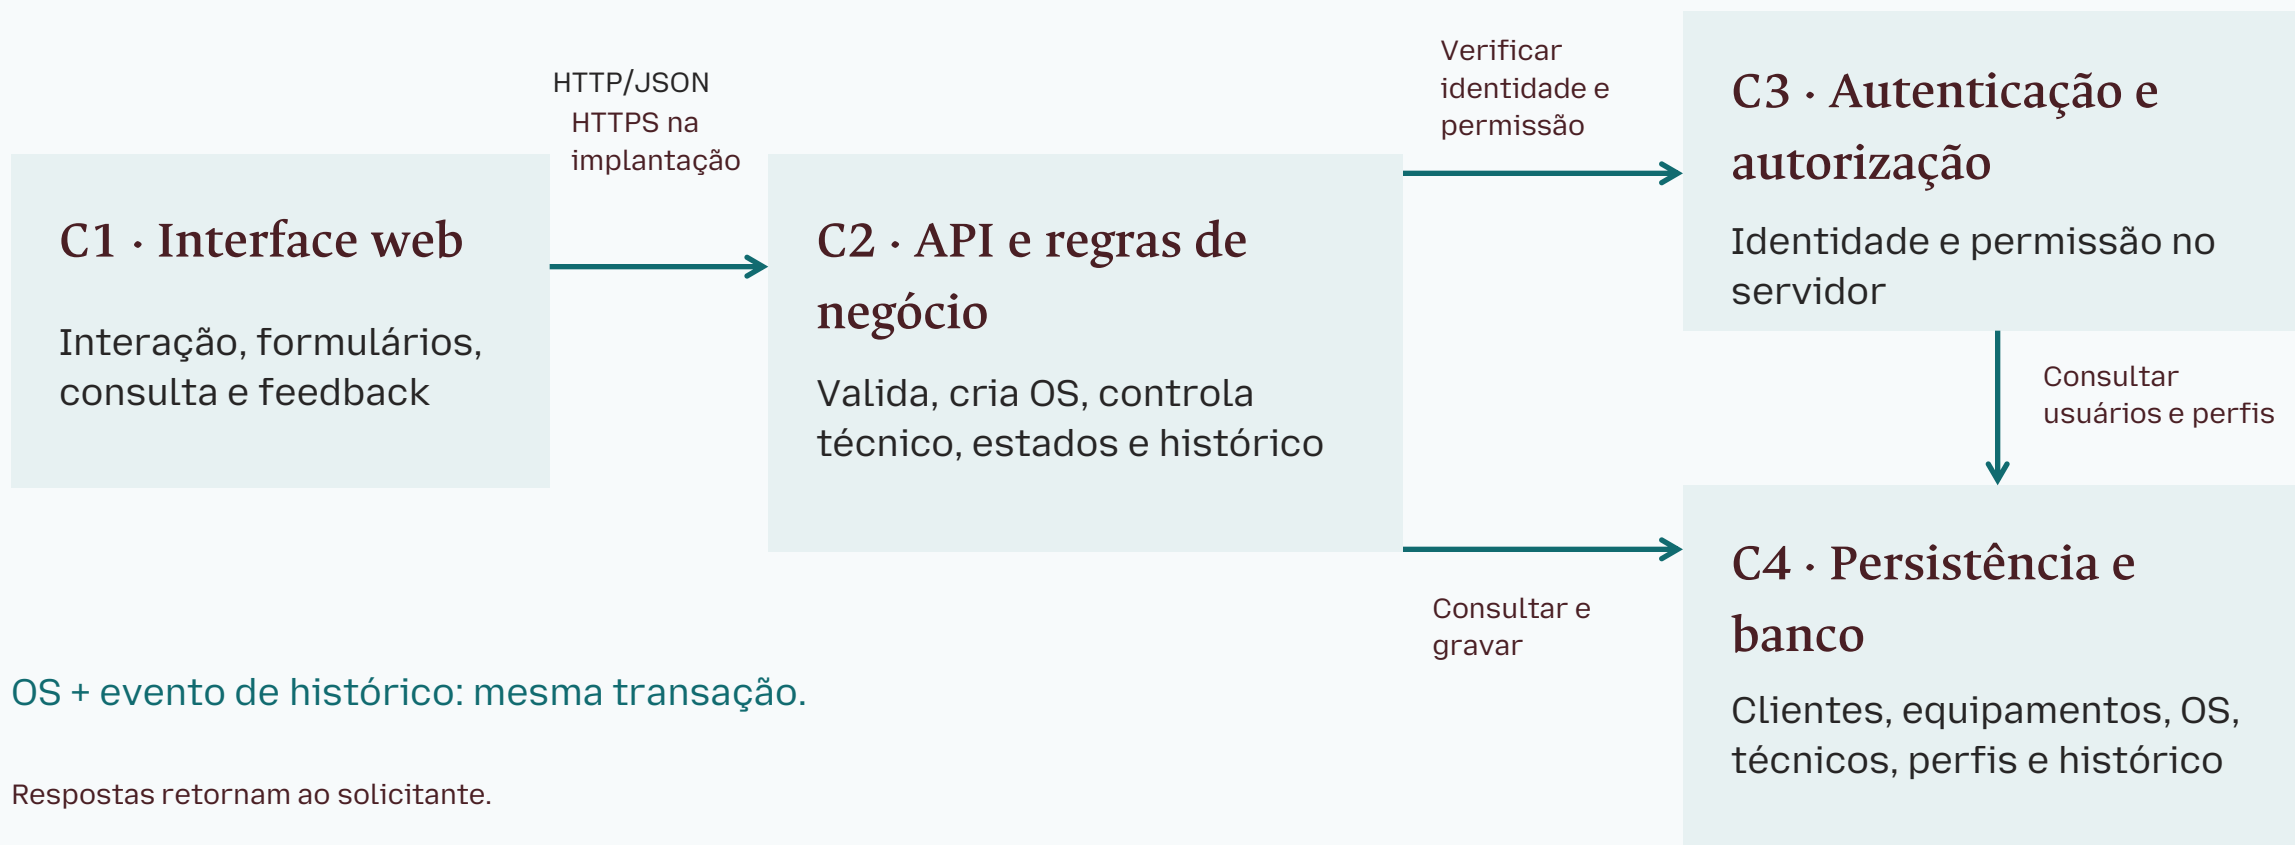

OS + evento de histórico: mesma transação.

Respostas retornam ao solicitante.

Arquitetura proposta; não exige microsserviços.

Da entrevista simulada à abertura e evolução da ordem de serviço

A3 · Origem → p. 2, §3 e §4.1: RF03 (OS), RF04 (estados), RF05 (técnico).

A4 / A5 → RE2 → RF2 + RN1 e HU1/HU2; critérios refinados na A5.

A8 · Trabalho → A8R03 abre no I1; A8R06/R07 atribuem, iniciam e concluem no I2.

A9 · Modelos → §2.2 fluxograma + §2.3 wireframe detalham cadastro e abertura.

A10 · Destino → C1 interage; C2 aplica regras; C3 autoriza; C4 grava OS e evento.

Marcos Almeida é o personagem da simulação A3. RF03 da A3 e RF3 da A4/A5 têm significados diferentes.

Requisitos ligados à origem e aos componentes

Requisito	Origem na A3	A8 · itens	Modelo / decisão	Componentes
RF1	p. 2 RF01/02; p. 3 RF14	R02	A9 §2.2/2.3: cadastro	C1, C2, C4
RF2	p. 2 RF03–RF05	R03/06/07	A9: abertura; A10 §2.3: ciclo	C1–C4
RF3	p. 2 RF06/07	R04/05/08	A10 §2.6: consulta/histórico	C1, C2, C4
RN1	p. 2 RF04; A5 refina regra	R03/06/07	A10 §2.3: sem regressão	C2, C4
RNF1	p. 2–3 RNF01–03; A5: metas	R09	A8 §2.4 / A10 §2.6: medição	C1, C2, C4
RNF2	p. 2 RF12; p. 3 RNF04/05	R01	A9/A10: autorizar no servidor	C2, C3, C4
HU1	p. 2 RF01–03/06/07	R02–05/08	A9: atendente; A10: consulta	C1–C4
HU2	p. 2 RF04/05/12	R05–07	A10: técnico; tela a detalhar	C1–C4

Fonte: A3 §4; matriz completa em A10 §2.5. C3 autoriza transversalmente as operações protegidas.

As quatro peças orientam a próxima etapa

A7 · Processo

Como trabalhar e verificar

A8 · Planejamento

O que entrega valor e em que ordem

A9 · Modelos

Como o comportamento deve ocorrer

A10 · Arquitetura

Qual componente atende ao requisito

Na AS: integrar e comprovar

- Integrar interface, API e banco
- Autorizar cada operação no servidor
- Testar regras, estados e falhas
- Medir desempenho e registrar evidências

Hoje: frontend local e Java separados. A integração é trabalho planejado.

RNF1: ≥95% das operações em até 2 s, com até 10.000 OS. Registrar ambiente e cenário.

Exposição: 11 minutos · Perguntas: 4 minutos
